


RESUMEN DE PROYECTO									
ESTADO ACTUAL PROYECTO									
Plazo de Ejecución		Avance Anterior		Avance Actual		Variación Periodos		Desviación Proyecto	
Reprog.-5:	08/08/25	Corte al:	07/11/25	Corte al:	21/11/25	Días:	14	Resp. Obra:	7.12%
Inicio Obra:	30/01/21	% Plan	88.14%	% Plan	94.60%	% Plan:	6.46%	Inicio Tardío:	5.22%
Fin Línea Base:	26/12/25	% Real	78.85%	% Real	80.46%	% Real:	1.61%	Contratación	1.80%
Fin Pronóstico:	09/01/26	% Desv:	9.29%	% Desv:	14.14%	% Desv:	4.85%	Proyecto:	0.00%
		14 días						14.14%	

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN									
Partida	Peso%	Subcontrato	PPO Actual	Reprogramación 5		Avance Acumulado			
				Inicio	Fin	Plan	Real	Desv.	
PRELIMINARES	5.03%	87 CONTRATOS	\$27,786,643.06	11/01/21	9/09/24	100.00%	100.00%	✓ 0.00%	
CIMENTACIÓN	5.21%	NOLIT	\$31,819,203.65	18/02/21	3/10/25	100.00%	95.00%	✗ -5.00%	
		OTROS	\$90,418.32						
		POSTENSA	\$95,130,163.48						
		ACEROS VIMAR	\$59,570,567.56						
ESTRUCTURA	35.98%	POWER SUPPORT	\$39,993,567.70	8/11/21	14/11/25	100.00%	98.42%	⚠ -1.58%	
		GRUPO BAYSA	\$4,306,516.31						
		OTROS	\$1,725,800.78						
		RE NUEVA	\$12,300,000.96						
ALBAÑILERÍA	11.66%	KONKRETA	\$18,677,675.49						
		TEVI	\$5,181,183.31						
		POLAR	\$7,364,915.24	10/03/23	31/10/25	100.00%	87.29%	✗ -12.71%	
		DURO	\$2,793,430.72						
		OTROS	\$18,798,323.64						
		SIN CONTRATAR	\$1,265,085.94						
		RC DESIGN	\$12,277,016.53						
INSTALACIONES	11.94%	CONOR&E	\$23,779,519.24						
		TUVESA	\$15,500,000.00	21/02/23	12/12/25	94.82%	73.51%	✗ -21.31%	
		CYVSA	\$5,989,500.00						
		OTROS	\$4,428,645.74						
		SIN CONTRATAR	\$10,768,048.10						
CANCELERÍA	6.35%	VETROGALO	\$35,991,078.75	11/08/23	26/12/25	92.80%	85.50%	✗ -7.30%	
		SOMERLANNE	\$18,499,312.63						
ACABADOS	10.58%	J CARTER	\$25,490,957.67						
		SALVADOR AYALA	\$4,878,706.54	11/08/23	26/06/25	79.70%	45.29%	✗ -34.41%	
		ADR POOL	\$1,234,369.89						
		OTROS	\$772,591.16						
		SIN CONTRATAR	\$13,765,630.11						
		EDUARDO PÉREZ	\$7,108,799.13						
HERRERIAS	1.46%	SANRECK	\$5,354,380.00	10/10/23	31/10/25	99.50%	81.00%	✗ -18.50%	
		AGR	\$1,896,103.07						
		OTROS	\$209,409.41						
CARPINTERÍA	6.61%	SOMERLANNE	\$37,436,793.21	10/10/23	26/12/25	70.36%	8.60%	✗ -61.76%	
ELEVADORES	3.20%	CORELLIAN	\$18,139,526.10	10/05/23	26/12/25	99.30%	97.60%	⚠ -1.70%	
		TEVI	\$2,774,042.69						
OBRAS EXTERIORES	1.52%	BALBEK	\$835,347.59	17/11/23	14/11/25	100.00%	57.30%	✗ -42.70%	
		OTRO	\$142,552.54						
		SIN CONTRATAR	\$4,867,176.22						
SEÑALÉTICA Y PINTURA	0.17%	SIN CONTRATAR	\$949,356.91	10/11/25	26/12/25	49.40%	0.00%	✗ -49.40%	
		AUTO ACCESORIO	\$277,971.63						
LIMPIEZAS	0.29%	OTROS	\$436,745.31	27/07/25	26/12/25	63.70%	50.00%	✗ -13.70%	
		SIN CONTRATAR	\$928,537.73						
TOTAL:			\$581,535,614.06	11/01/21	26/12/25	94.60%	80.46%	14.14%	

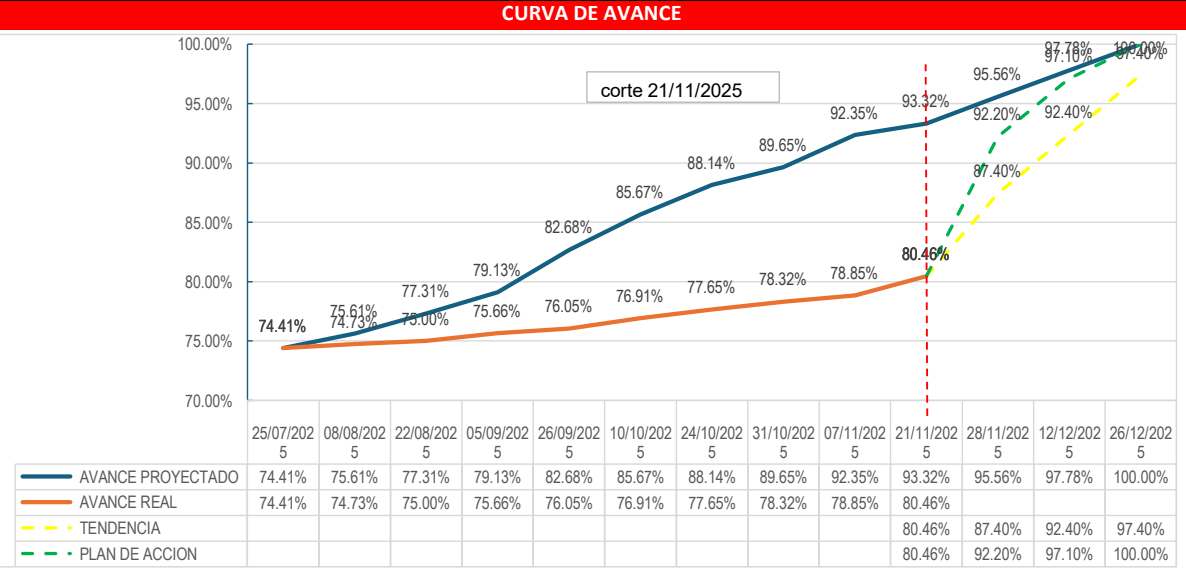

CUMPLIMIENTO PUNTOS CRÍTICOS DE STAKEHOLDER DURANTE EL PERIODO				
ÁREA	STOPPERS, RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS	RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIÓN REQUERIDA
COSTOS Y CONTRATOS	● Reconstratación de detalles y cierres de tablarocas de los sótanos	Abigail Romero / FA	63	Se debe de reconstratar los niveles pendientes de tablaroca, estos niveles ya cuentan con avance en primeras caras de tablaroca, se requiere iniciar trabajos a mas tardar el 20 de octubre.
	● Contratación de muebles sanitarios y accesorios del nivel de amenidades	Abigail Romero / FA	42	Se requiere contar con el suministro inmediato de monomandos en obra, el aplanado en la zona de baños se encuentra detenido por falta de los mismos. De seguir con el retraso del suministro ocasionara retrabajos y sobre costos para su instalación.
	● Contratación de pisos de porcelanatos y canteras del nivel de amenidades	Abigail Romero / FA	35	Urge cerrar contratación de pisos de porcelanato y de mármol, se requiere iniciar su colocación a mas tardar el 25 de noviembre, se debe de considerar que en caso del mármol puede tardar su suministro hasta 3 semanas.
	● Contratación de pisos en vestíbulos de elevadores y en cabinas de elevadores.	Abigail Romero / FA	28	Se requiere asignar contratista para el suministro y colocación de manera inmediata, de no contar con esta contratación no se pueden entregar niveles completos. Para poder cerrar en diciembre se requiere iniciar los trabajos el 18 de noviembre.
	● Contratación de constru panel para cubierta de caseta de vigilancia	Abigail Romero / FA	7	Se requiere cerrar contratación de cubierta de construpanel de la caseta de vigilancia, los trabajos de la caseta se inician el día 24 de noviembre.
	● Contratación de cantera para caseta de vigilancia	Abigail Romero / FA	14	Se requiere cerrar contratación de la cantera para la caseta de vigilancia, los trabajos de la caseta se inician el día 24 de noviembre.
OBRA	● Falta fuerza de trabajo para carpinterías	Ing. Sherley Velázquez	49	Se continua con una fuerza de trabajo de solo 4 carpinteros, se trabaja en los departamentos 4C, 5B y 5C desde hace 3 semanas, actualmente se encuentran liberados y eentregados a Somerlanne los departamentode de los niveles 6 al 9, se requiere terminar 5 niveles de carpinterías semanales.
	● Pisos de amenidades	Ing. Sherley Velázquez	42	Se requiere la contratación inmediata de pisos de porcelanatos y de mármol en amenidades, ya se tiene sofrefirmes para recibir piso el área de salón de adultos, jóvenes, gimnasio y kids.
	● Pisos de vestíbulos	Ing. Sherley Velázquez	35	Se requiere la contratación inmediata de pisos de vestíbulos de elevadores y cabinas de elevadores, urge iniciar los trabajos el día 18 de noviembre.
	● Instalación de verticales hidráulicas	Ing. Sherley Velázquez	42	Hace falta suministro de válvulas seccionadoras para poder continuar con la instalación de la vertical hidráulica, actualmente La instalacón se encuentra hasta el nivel 17, de no realizar el suministro de materiales de manera inmediata no se podrá tener suministro de agua en los departamentos poniendo en riesgo las fechas de termino del proyecto.
	● Falta fuerza de trabajo para instalaciones eléctricas	Ing. Sherley Velázquez	21	Se requiere incrementar fuerza de trabajo para las instalaciones eléctricas, la fuerza de trabajo actual es de 10 personas y los niveles 29 y 30 se encuentran retrasados para cableado, retrasando el sierre de 2das caras de tablaroca.
	● Aplanado en fachadas.	Ing. Sherley Velázquez	37	No se logro cumplir con lo programado de terminar la fachada norte en la sección AB, no se cuenta con fuerza de trabajo de Polar desde el día 11 de noviembre. El avance se continua con Limpia alto en la sección CD de la fachada corte con 12 personas.


ACCIONES REQUERIDAS PLAN DE ACCIÓN

- Suministro inmediato de monomando a para la conclusión de aplanados en área de baños.
- Acelerar el proceso de contratación de pisos de amenidades, se requiere contar con suministro de piso de mármol y cantera de manera inmediata
- Incrementar fuerza de trabajo de Orve de manera inmediata, se requiere contar con un mínimo de 30 personas.
- Incrementar fuerza de trabajo de limpia alto para poder atacar la fachada sur de forma simultanea.
- Incrementar fuerza de trabajo de TUVESA, se requiere contar con un equipo exclusivo para la vertical hidráulica que incluy e los trabajos de cuadro de válvulas por nivel, cuarto de bombas y acometida hidráulica, otro equipo para el cierre de instalación de pci, verticales sanitarias y pluviales , y un equipo exclusivo para la colocación de accesorios y muebles sanitarios.

PROYECCIÓN AVANCE +3 MESES

	Fecha	Avance planeado	Proyección Real		Desviación		Mitigación
			Tendencia	Plan de Acción	Tendencia	Plan de Acción	Plan de Acción
Avance Actual	21/11/2025	94.60%	80.46%	79.55%	-14.14%	-15.05%	0.91%
Proyección Cierre M2	30/11/2025	95.99%	83.32%	94.30%	-12.67%	-1.69%	5.05%
Proyección Cierre M3	26/12/2025	100.00%	94.30%	100.00%	-5.70%	0.00%	7.00%

PRINCIPALES ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL PERIODO				
PARTIDA	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	ESTATUS	FECHA
Estructura	BAYSA	Montaje de canoppy y caseta de vigilancia	!	26/11/2025
Albañilerías	TEVI	Termino de muros en estacionamientos 1 al 4	✗	20/10/2025
		Muro exterior de Pet Park	✗	12/09/2025
	Tierra en movimiento	Colado de losa de cimentación Sótano 5	!	10/11/2025
		Habilitado de acero para cimentación de canoppy	!	08/11/2025
	ADG	Colado de sobre firmes nivel de amenidades	!	31/10/2025
Instalaciones	Limpia Alto	Aplanado de fachada norte sección AB	!	20/11/2025
		Instalación de equipos de bombeo	!	15/11/2025
		Instalación de Vertical hidráulica	✗	11/10/2025
		Instalación hidráulica nivel 30	!	27/09/2025
	ORVE	Instalación hidráulica nivel 31	!	26/09/2025
		Cableado de alimentadores amenidades	✓	18/10/2025
Elevadores	BLT	Montaje de elevador principal sección CD	✗	04/10/2025
Herrerías	Sanreck	Puertas de bodegas sótano 1	✓	07/11/2025
TABLAROCAS	Salvador Ayala	Plafón nivel de amenidades	✓	10/10/2025
		Aplanados en muros de albañilería en amenidades	!	31/10/2025
		Liberación para carpinterías niveles 8 - 9	!	11/10/2025
Carpinterías	Somerlanne	Carpinterías del nivel 4	✓	10/10/2025
		Carpinterías del nivel 5	✗	22/09/2025
Obras Exteriores	Texis	Carpinterías del nivel 5	✗	10/10/2025
		Colado de losa de rodamiento	!	15/11/2025

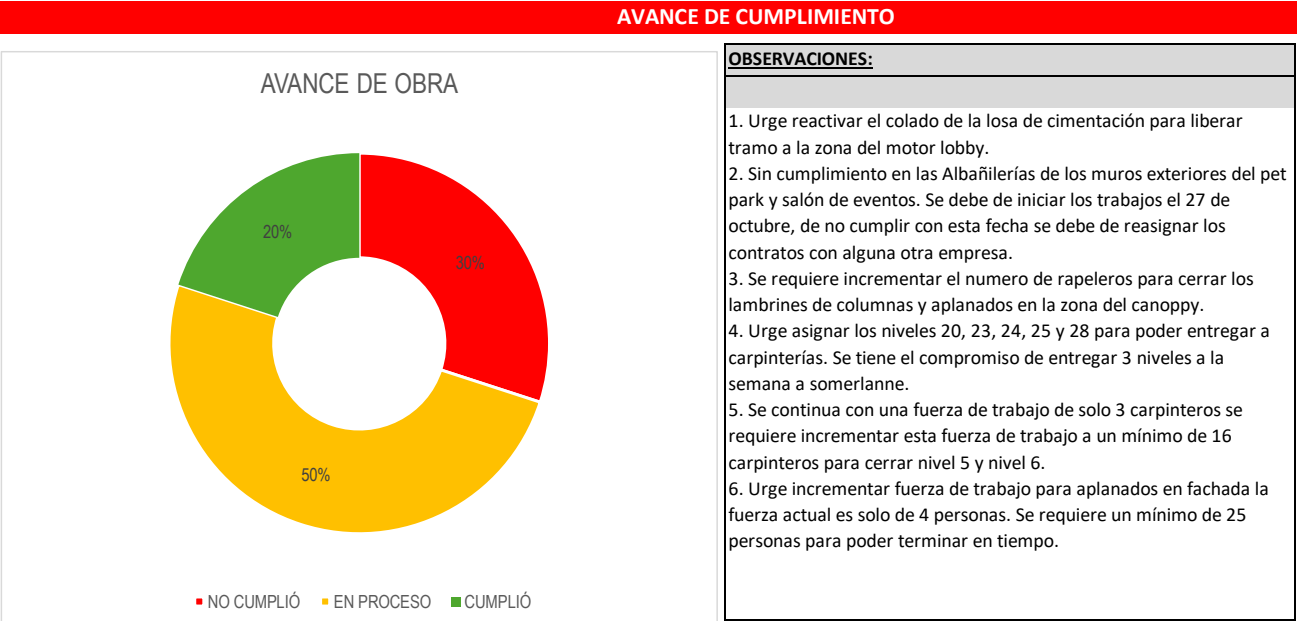

REPORTE FOTOGRÁFICO

Termino de instalación de elevador principal sección CD

Avance de 70 % de cancelerías del nivel 31

Avance del 80% en colocación de pisos de porcelanato de los nivel 15 y 16

Carpinterías de los departamentos A, B y C del nivel 4 y 5A

Termino de plafón y muros de tablaroca del nivel de



Avance del 80% en aplanado de la fachada norte sección BC

Inicio de montaje de estructura para canoppy principal

Avance de colado de vialidad del 60%

Inicio de instalación de equipos de bombeo


Termino de cancelerías del nivel de amenidades

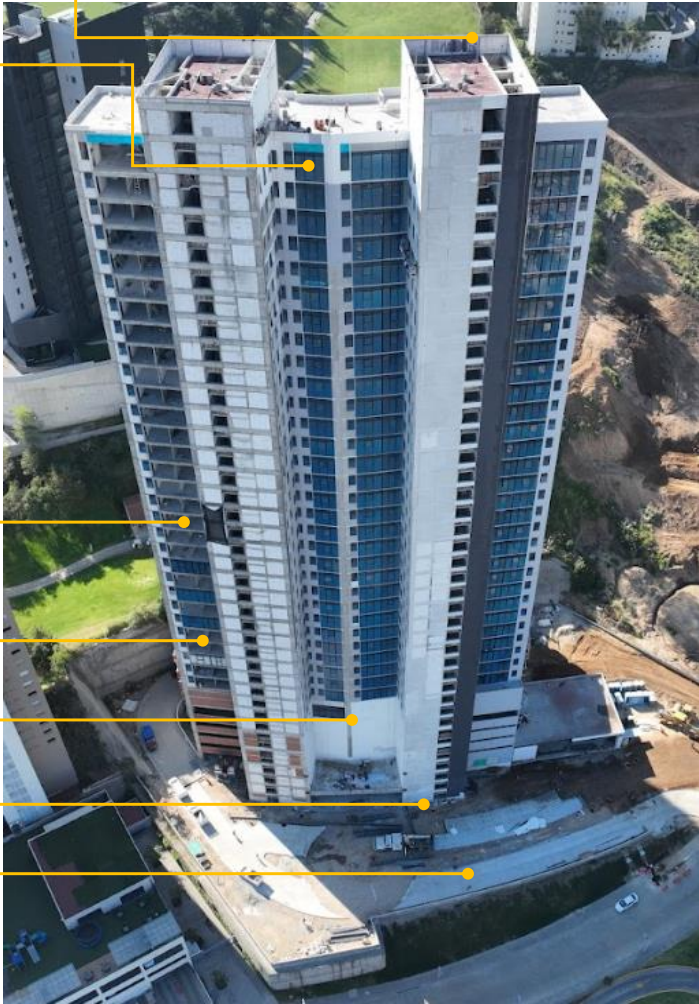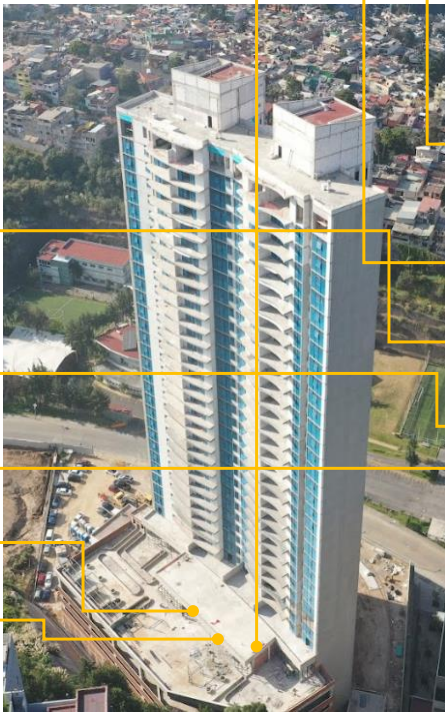

PLANEADO 94.60%	EJECUTADO 80.46 %	DESVIACIÓN -14.14 %
--------------------	----------------------	------------------------



Estructura de canoppy principal

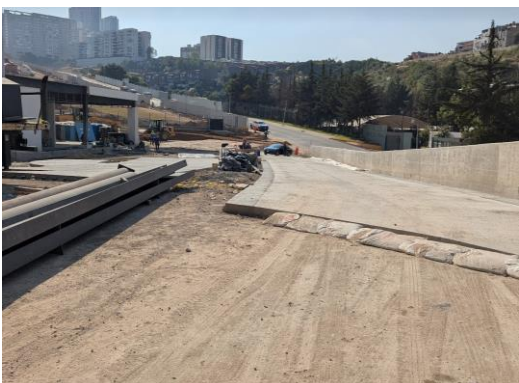

Colado de vialidad



Alberca



Cancelería Amenidades

ESTADO DE CUENTA

CONTRATISTA	CONTRATADO	ANTICIPO	TOTAL ESTIMADO	TOTAL AMORTIZADO	TOTAL FONDO DE GARANTIA	RIESGO
ACEROS VIMAR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 59,570,567.56	\$ 24,489,652.33	\$ 51,353,937.55	\$ 24,489,652.33	\$ -	\$ -
ADG CONSTRUCCIÓN DESARROLLOS E INVERSION SA DE CV						
BLUE/BOS-2227/2510/ADG/C-03	\$ 2,418,540.98	\$ 725,562.29	\$ 366,919.30	\$ 110,075.79	\$ 27,518.94	\$ 615,486.50
ADR POOLS S.A. DE .C.V	\$ 1,673,832.44	\$ 425,644.86	\$ 621,252.76	\$ 248,501.10	\$ 46,593.95	\$ 177,143.76
ADRIAN JIMENEZ SANCHEZ	\$ 75,284.00	\$ -	\$ 64,900.00	\$ -	\$ -	\$ -
AGR PUERTAS S.A. DE C.V.	\$ 1,896,103.07	\$ 1,327,272.15	\$ 1,564,224.11	\$ -	\$ 6,773.51	\$ 1,327,272.15
AIRCRETE MEXICO SAPI DE CV	\$ 3,696,467.47	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -
ALFA G SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$ 246,785.54	\$ 103,550.00	\$ 246,785.54	\$ 103,550.00	\$ -	\$ -
ALFREDO JONATHAN RUBI CAMACHO	\$ 721,500.00	\$ -	\$ 621,982.65	\$ -	\$ 31,099.20	\$ -
ASAGEN ENERGIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 442,841.50	\$ -	\$ 214,023.94	\$ -	\$ -	\$ -
AUTO ACCESORIOS Y CONSTRUCCIONES FAMA SA DE CV	\$ 420,524.17	\$ -	\$ 242,738.91	\$ -	\$ 1,429.89	\$ -
CALENTADORES INSTATANEOS NORDICOS, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 1,075,041.60	\$ -	\$ 926,760.00	\$ -	\$ -	\$ -
CEMEX S.A.B. DE C.V.	\$ 140,967.84	\$ -	\$ 121,524.00	\$ -	\$ -	\$ -
CÉSAR MENDEZ FRANCO S.C.	\$ 44,660.00	\$ -	\$ 38,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
CIMANC CIMENTACIONES Y ANCLAJES, S.A. DE C.V.	\$ 92,738.52	\$ -	\$ 79,947.00	\$ -	\$ -	\$ -
CONOR&E, S.A. DE C.V.	\$ 24,430,807.95	\$ 8,000,000.00	\$ 18,156,911.87	\$ 6,064,278.35	\$ 1,315,241.86	\$ 1,935,721.65
CONSTRUCCIONES DF, S.A. DE C.V.	\$ 834,009.82	\$ 675,594.92	\$ 637,790.73	\$ 251,197.43	\$ 31,889.54	\$ 424,397.49
CONSTRUCTORA BALBEK SA DE CV	\$ 2,781,896.16	\$ 764,957.16	\$ 2,007,015.76	\$ 670,239.92	\$ 150,526.18	\$ 94,717.24
CONSTRUCTORA NOLIT	\$ 32,164,203.63	\$ 9,905,276.19	\$ 22,796,043.55	\$ 6,889,175.16	\$ 1,139,802.20	\$ 3,016,101.03
CONSTRUCTORA TIERRA EN MOVIMIENTO						
BLUE/BOS-2260/2510/CTM/C01	\$ 3,113,548.47	\$ -	\$ 262,683.00	\$ -	\$ 78,804.90	\$ -
BLUE/BOS-2260/2510/CTM/C02	\$ 1,626,802.74	\$ -	\$ 62,765.49	\$ 18,829.65	\$ 4,707.41	\$- 18,829.65
CORELLIAN, S.A. DE C.V.	\$ 18,139,526.10	\$ -	\$ 16,245,702.52	\$ -	\$ -	\$ -
CORTES HERNADEZ ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$ 57,175.33	\$ -	\$ 49,289.08	\$ -	\$ -	\$ -
CREACIONES QUE VISTEN MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 56,439.80	\$ -	\$ 48,655.00	\$ -	\$ -	\$ -
CRISTINA TORRES VELAZQUEZ	\$ 48,773.36	\$ 12,613.80	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 12,613.80
CYVSA OBRAS, S.A. DE C.V.	\$ 5,989,500.00	\$ -	\$ 4,294,110.15	\$ -	\$ 126,937.47	\$ -
DHIR INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 246,669.12	\$ 47,507.42	\$ 199,033.17	\$ 47,507.42	\$ 9,951.66	\$ -
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN MONE, S.A. DE C.V.	\$ 50,251.20	\$ -	\$ 43,320.00	\$ -	\$ -	\$ -
DURO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ 2,793,430.72	\$ 1,224,933.98	\$ 1,223,553.14	\$ 517,011.36	\$ 91,766.45	\$ 707,922.62
ELVEC, S.A. DE C.V.	\$ 31,378.00	\$ -	\$ 27,050.00	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPOS ESPECIALES D&M, S.A. DE C.V.	\$ 6,467,444.78	\$ 759,600.00	\$ 5,877,951.20	\$ -	\$ -	\$ 759,600.00
EVELIA SAMIENTO HUERTA						
OT-BR-BLUE-90	\$ 393,033.52	\$ -	\$ 209,172.80	\$ -	\$ 12,576.28	\$ -
EXCAVACIONES SANTANA, S.A. DE C.V.	\$ 8,000,000.29	\$ -	\$ 8,000,000.29	\$ -	\$ -	\$ -
FERRECABSA SA DE CV	\$ 65,390.08	\$ -	\$ 56,370.76	\$ -	\$ -	\$ -
FORESTAL Y COMERCIAL, SA DE CV	\$ 29,777.20	\$ -	\$ 25,669.83	\$ -	\$ -	\$ -
GAS NATURAL	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -
GRUPO BAYSA, S.A. DE C.V.	\$ 1,404,807.00	\$ 898,654.40	\$ 1,334,565.70	\$ 853,723.00	\$ 66,728.28	\$ 44,931.40
GRUPO CONSTRUCTOR FAGOC SA DE CV	\$ 696,105.38	\$ -	\$ 439,456.72	\$ -	\$ 32,959.25	\$ -
HOME DEPOT DE MEXICO S. DE R.L. DE CV	\$ 528,960.00	\$ -	\$ 437,760.00	\$ -	\$ -	\$ -
INTEGRA DEX, S.A. DE C.V.	\$ 562,316.84	\$ -	\$ 544,133.26	\$ -	\$ 21,751.58	\$ -
ISRAEL ESPARTACO HERNANDEZ GUERRERO	\$ 145,473.32	\$ 28,184.23	\$ 125,408.04	\$ 28,184.23	\$ -	\$ -
IVONNE TLALINI CHAVEZ SANCHEZ	\$ 43,425.50	\$ 8,778.65	\$ 8,173.43	\$ -	\$ -	\$ 8,778.65
J CARTER INTERIORES S.A.S. DE C.V.	\$ 32,017,605.35	\$ 10,815,819.52	\$ 17,211,857.52	\$ 4,860,872.89	\$ 1,290,890.02	\$ 5,954,946.63
JESUS CRISTOBAL SAAVEDRA BERNAL	\$ 46,400.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
KONKRETA	\$ 19,304,739.16	\$ 9,637,329.22	\$ 19,316,530.32	\$ 9,496,365.18	\$ 1,448,739.61	\$ 140,964.04
LACECO, S.A. DE C.V.	\$ 67,164.00	\$ 28,950.00	\$ 57,900.00	\$ 28,950.00	\$ -	\$ -
LEONARDO CRUZ QUEZADA	\$ 172,050.00	\$ -	\$ 74,159.48	\$ -	\$ -	\$ -
LISSAME CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 13,455.21	\$ -	\$ 11,599.32	\$ -	\$ -	\$ -
LOMCCI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$ 2,120,770.00	\$ -	\$ 1,823,958.33	\$ -	\$ 91,197.92	\$ -
M + A MOVIMIENTO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$ 415,468.23	\$ 100,508.56	\$ 71,560.23	\$ 13,417.53	\$ 2,236.26	\$ 87,091.03
MARIA EUGENIA ORDOÑEZ	\$ 23,351.08	\$ -	\$ 20,130.24	\$ -	\$ -	\$ -
MARIBEL DE JESUS RAMOS	\$ 3,217,028.00	\$ -	\$ 2,773,300.00	\$ -	\$ 138,665.00	\$ -
MARIO EDUARDO ORTEGA MUÑOZ	\$ 2,925,356.82	\$ 2,229,498.94	\$ 2,925,754.36	\$ 672,707.83	\$ 146,287.72	\$ 1,556,791.11
MAYOLO VELAZQUEZ GONZALEZ	\$ 70,808.20	\$ -	\$ 19,855.01	\$ -	\$ -	\$ -
METALITEC MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 2,901,709.31	\$ 1,400,074.74	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 1,400,074.74
MEXPLANO S.A. DE C.V.	\$ 1,000,143.82	\$ 225,000.00	\$ 780,959.45	\$ 222,738.93	\$ 58,571.97	\$ 2,261.07
NAYELLY LIZBETH SERRATO MAYA	\$ 25,147.64	\$ -	\$ 21,679.00	\$ -	\$ -	\$ -
OSCAR EDUARDO PEREZ JUAREZ	\$ 7,197,564.19	\$ 1,693,665.01	\$ 2,122,143.04	\$ 536,303.22	\$ 159,160.74	\$ 1,157,361.79
POLAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ 8,601,929.22	\$ 1,791,004.84	\$ 4,301,906.78	\$ 1,032,415.20	\$ 318,630.14	\$ 758,589.64
POSTENSA LGS, S.A. DE C.V.	\$ 95,130,163.48	\$ 30,004,053.56	\$ 92,813,429.57	\$ 29,269,400.87	\$ 4,640,671.47	\$ 734,652.69
POWER SUPPORT, S.A. DE C.V.	\$ 40,424,679.84	\$ 12,309,878.26	\$ 34,848,868.54	\$ 12,309,878.26	\$ -	\$ -
RAMON GARCIA RICO	\$ 70,566.91	\$ -	\$ 60,833.54	\$ -	\$ -	\$ -
RCDESIGN S.A. DE C.V.	\$ 12,648,179.89	\$ 6,000,000.00	\$ 11,951,644.35	\$ 3,328,897.50	\$ 896,373.36	\$ 2,671,102.50
RENE VELASCO PORTUGAL	\$ 658,693.61	\$ 179,321.79	\$ 257,951.36	\$ 146,810.89	\$ -	\$ 32,510.90
RE NUEVA AS, S DE RL	\$ 12,490,731.48	\$ 12,300,000.96	\$ 11,443,473.70	\$ 4,552,935.83	\$ 858,260.53	\$ 7,747,065.13
RESISTENCIAS SAN MARINO, S.A. DE C.V.	\$ 1,781,678.80	\$ 202,064.00	\$ 1,388,895.00	\$ 177,246.00	\$ -	\$ 24,818.00
RLAMD, S.A. DE C.V.	\$ 43,413.42	\$ -	\$ 37,425.36	\$ -	\$ -	\$ -
S & V SANTA FE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$ 109,397.66	\$ -	\$ 109,397.66	\$ -	\$ -	\$ -
SALVADOR AYALA GONZALEZ	\$ 13,654,143.33	\$ 862,068.97	\$ 5,793,582.66	\$ 656,414.25	\$ 289,679.12	\$ 205,654.72
SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 195,990.60	\$ -	\$ 134,034.83	\$ -	\$ -	\$ -
SANRECK PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV	\$ 6,314,838.19	\$ 1,390,000.00	\$ 3,457,530.43	\$ 642,827.01	\$ 259,314.78	\$ 747,172.99
SATORI SOLUCIONES INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	\$ 5,962.40	\$ -	\$ 5,140.00	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS DE INTEGRACIÓN COMERCIALES SANZ SIERRA SA DE CV						
BLUE/BOS2254/2510/SICS/C-02	\$ 4,500,000.00	\$ 900,000.00	\$ 348,384.21	\$ 69,676.84	\$ 26,128.82	\$ 830,323.16
SERVINTRAC SA DE CV	\$ 850,000.00	\$ 425,000.00	\$ 340,000.00	\$ 170,000.00	\$ 25,500.00	\$ 255,000.00
SIN CONTRATISTA	\$ 31,278,749.07	\$ -	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ -
SOLUCIONES INTEGRALES AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$ 69,007.12	\$ -	\$ 59,488.89	\$ -	\$ -	\$ -
SOLUCIONES INTEGRALES TUVESA	\$ 15,500,000.00	\$ 4,650,000.00	\$ 5,607,442.30	\$ 1,682,232.69	\$ 280,372.11	\$ 2,967,767.31
SOMERLANNE, S.A. DE C.V.	\$ 55,936,105.84	\$ 47,740,329.78	\$ 997,244.36	\$ -	\$ -	\$ 47,740,329.78

CONSTRUCTORA NOLIT


DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Subcontratista	Importe	Tipo de Contrato	Anticipo	Retención	Fecha Inicio	Fecha Término	Plazo Ejecución	Penalizaciones
NOLIT	\$ 26,936,494.69	P. Max. Garantizado	\$ 9,580,948.74	\$ 1,074,560.33	01/02/2021	04/07/2025	1,614 días	Si, 5% al millar
instalaciones	\$ 1,246,878.87	P. Max. Garantizado	\$ 269,814.29	\$ 16,550.98	01/02/2021	10/11/2024	1,378 días	Si, 5% al millar

SITUACIÓN DEL CONTRATO

Obra Ejecutada	Obra Estimada	OENE	Ant. Amortizado	Retención 5%	Saldo Anticipo	Riesgo - Flujo	Deductivas	Aditivas
\$ 21,491,609.55	\$ 21,491,609.55	\$ -	\$ 6,607,001.77	\$ 1,074,560.33	\$ 2,973,946.97	\$ 1,899,386.64	\$ -	\$ 2,976,737.69
\$ 639,873.36	\$ 639,873.36	\$ -	\$ 269,814.30	\$ 31,993.67	\$ -0.01	\$ -31,993.68	\$ -	\$ -

AVANCE POR FRENTES

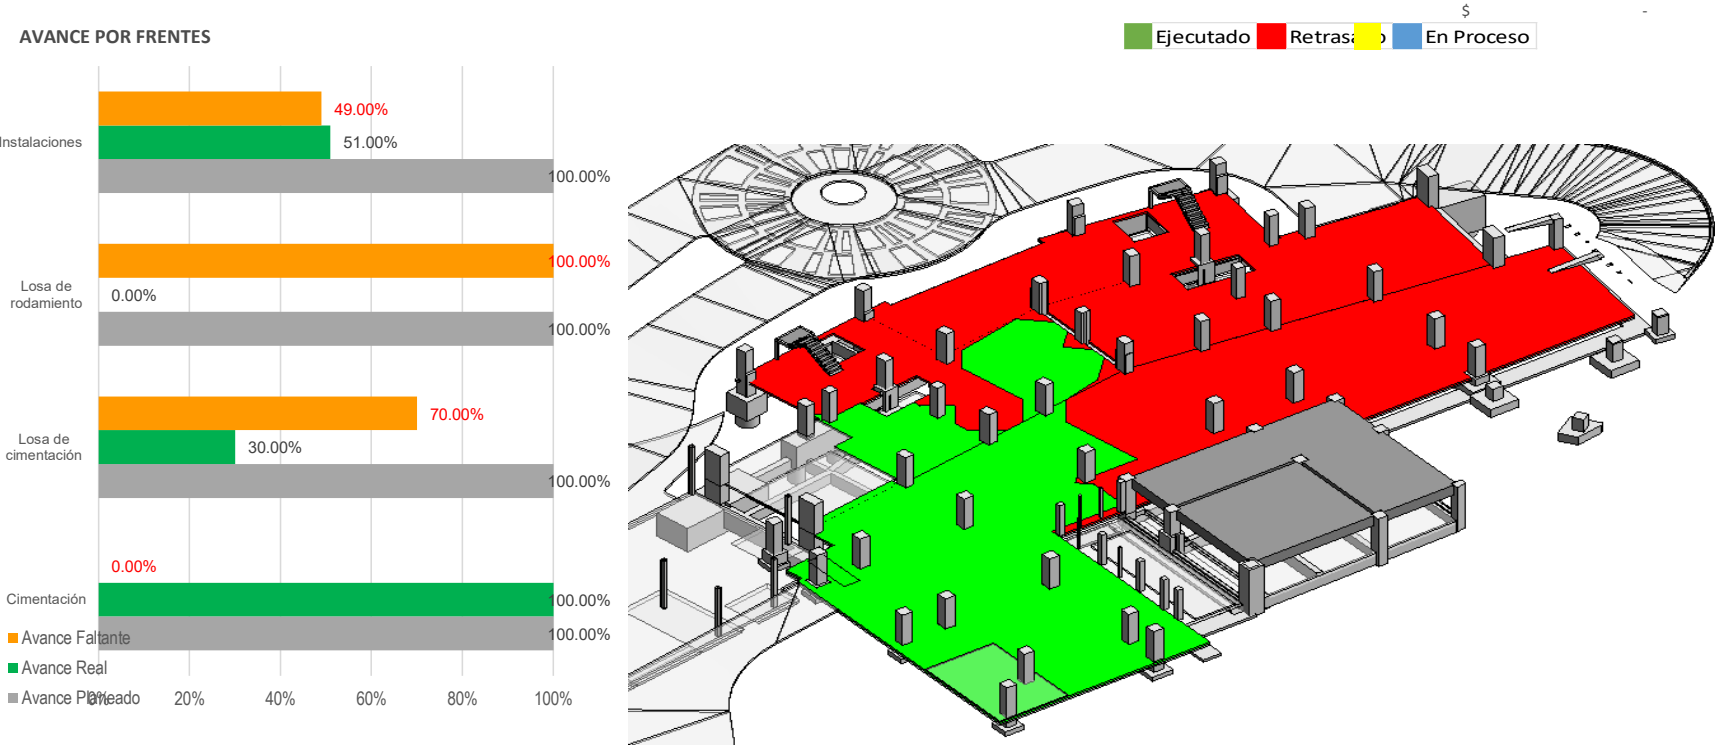

Sin avance desde el 2 de mayo en la losa de cimentación y de rodamiento

ESTRUCTURA

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO


Subcontratista	Importe	Tipo de Contrato	Anticipo	Retención	Fecha Inicio	Fecha Término	Plazo Ejecución	Penalizaciones
POSTENSA	\$ 95,130,163.48	P. Max. Garantizado	\$ 30,004,053.56	\$ -	02/08/2021	12/12/2023	862 días	5% al millar
POWER SUPPORT	\$ 39,993,567.70	P. Max. Garantizado	\$ 12,309,878.26	\$ -	17/12/2021	15/03/2023	453 días	5% al millar
ACEROS VIMAR	\$ 59,570,567.56	P. Max. Garantizado	\$ 24,489,652.33	\$ -	08/11/2021	29/01/2023	447 días	5% al millar

SITUACIÓN DEL CONTRATO

Obra Ejecutada	Obra Estimada	OENE	Ant. Amortizado	Retención	Saldo Anticipo	Riesgo - Flujo	Deductivas	Aditivas
\$ 95,130,163.48	\$ 92,813,429.57	\$ 2,316,733.91	\$ 29,269,400.87	\$ 4,640,671.47	\$ 734,652.69	\$ -6,222,752.69	\$ -	-
\$ 34,477,213.54	\$ 34,477,213.54	\$ -	\$ 12,309,878.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,576,031.07	\$ 3,674,738.54
\$ 51,353,937.55	\$ 51,353,937.55	\$ -	\$ 24,489,652.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,340,236.87	\$ -



AVANCE DE ESTRUCTURA

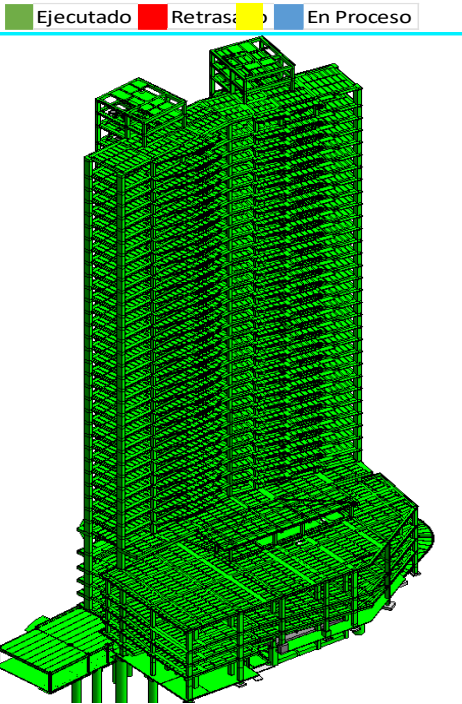



INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CONOR&E

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Subcontratista	Importe	Tipo de Contrato	Anticipo (35%)	Retención 7.5%	Fecha Inicio	Fecha Término	Plazo Ejecución	Penalizaciones
CONOR&E	\$ 22,000,000.00	P. Max. Garantizado	\$ 7,700,000.00	\$ 1,650,000.00	07/08/2023	31/05/2025	663 días	5% al millar

SITUACIÓN DEL CONTRATO

Obra Ejecutada	Obra Estimada	OENE	Ant. Amortizado	Retención 7.5%	Saldo Anticipo	Riesgo - Flujo	Deductivas	Aditivas
\$ 18,920,000.00	\$ 16,553,106.78	\$ 2,366,893.22	\$ 5,793,587.37	\$ 1,241,483.01	\$ 1,906,412.63	\$ -1,701,963.60	-	\$ -

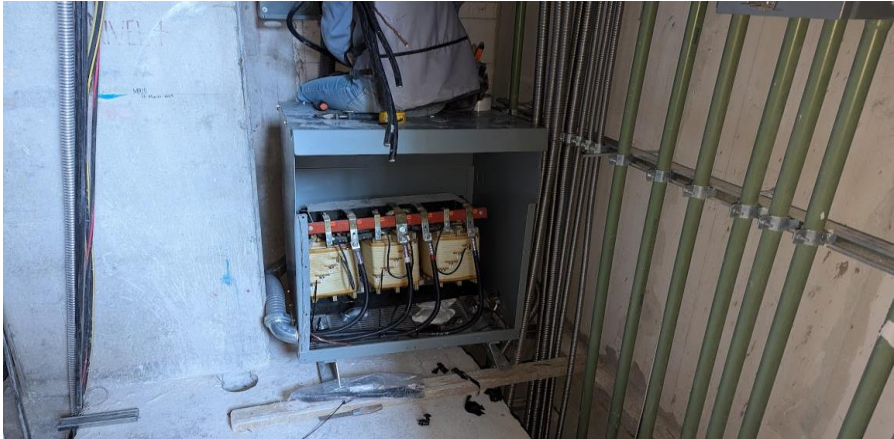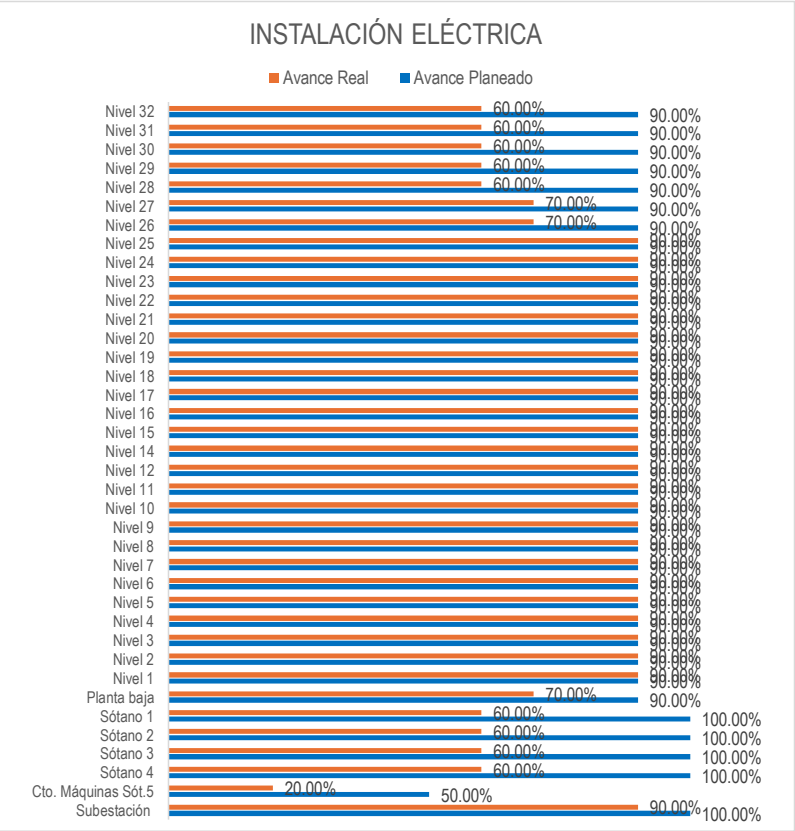

Instalación de distribución.





INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Subcontratista	Importe	Tipo de Contrato	Anticipo (30%)	Retención 7.5%	Fecha Inicio	Fecha Término	Plazo Ejecución	Penalizaciones
TUVESA	\$ 15,500,000.00	P. Max. Garantizado	\$ 4,650,000.00	\$ 1,162,500.00	17/06/2025	24/03/2026	281 días	5% al millar

SITUACIÓN DEL CONTRATO

Obra Ejecutada	Obra Estimada	OENE	Ant. Amortizado	Retención 7.5%	Saldo Anticipo	Riesgo - Flujo	Deductivas	Aditivas
\$ 2,045,000.00	\$ 1,920,900.44	\$ 124,099.56	\$ 576,270.13	\$ 144,067.53	\$ 4,073,729.87	\$ 3,805,562.78	-	\$ -

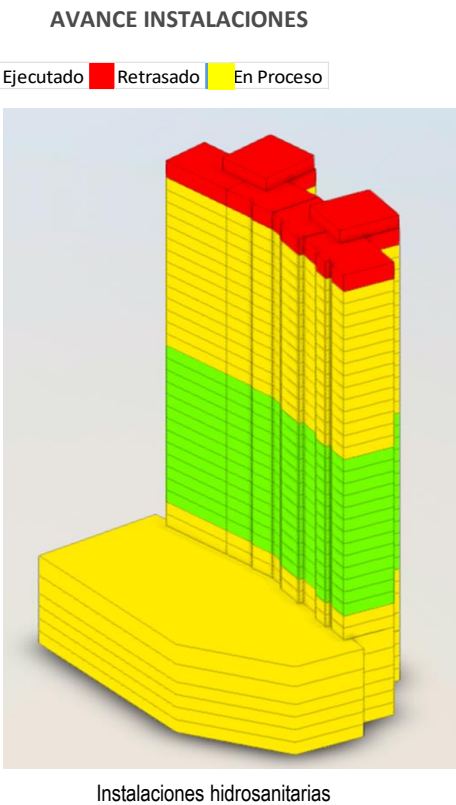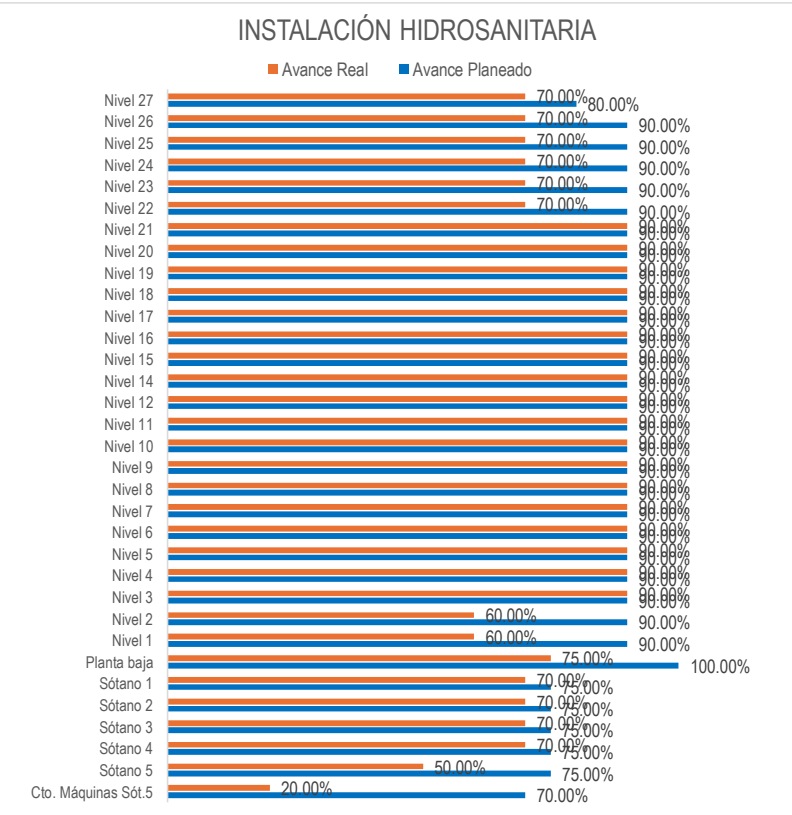

- 1 Se suministra el equipo de bombeo para instalación hidráulica
2. Se trabaja en vertical hidráulica del sótano 5 al nivel 10 de la sección CD
3. Se requiere incrementar fuerza de trabajo para continuar la instalación de PCI de los niveles 28 al 31



INSTALACION CHUT DE BASURA

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Subcontratista	Importe	Tipo de Contrato	Anticipo	Retención 0.0%	Fecha Inicio	Fecha Término	Plazo Ejecución	Penalizaciones
VERTICAL	\$ 2,633,475.10	Precio Máximo	\$ 1,589,166.07	\$ -	01/11/2021	04/09/2022	308 días	Si, máxima 10%

SITUACIÓN DEL CONTRATO

Obra Ejecutada	Obra Estimada	OENE	Ant. Amortizado	Retención 0.0%	Saldo Anticipo	Riesgo - Flujo	Deductivas	Aditivas
\$ 2,501,801.35	\$ 1,735,889.89	\$ 765,911.46	\$ 1,047,435.96	\$ -	\$ 541,730.11	\$ -224,181.34	-	\$ -

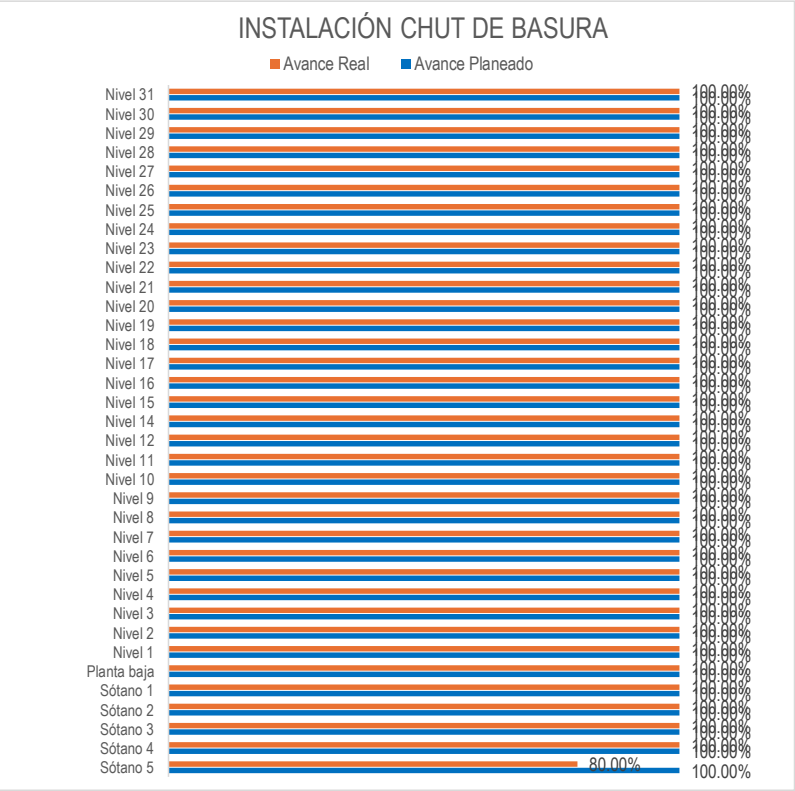

Se requiere liberación de sótano 5 para concluir la instalación del chut de basura



INSTALACIÓN DE HVAC

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Subcontratista	Importe	Tipo de Contrato	Anticipo (30%)	Retención 7.5%	Fecha Inicio	Fecha Término	Plazo Ejecución	Penalizaciones
CYVSA	\$ 5,989,500.00	Precio Máximo	\$ -	\$ -	28/04/2025	29/03/2026	336 días	Si, máxima 10%

SITUACIÓN DEL CONTRATO

Obra Ejecutada	Obra Estimada	OENE	Ant. Amortizado	Retención 7.5%	Saldo Anticipo	Riesgo - Flujo	Deductivas	Aditivas
\$ 5,091,075.00	\$ 4,294,110.15	\$ 796,964.85	\$ -	\$ 77,321.06	\$ -	\$ -874,285.91	-	\$ -

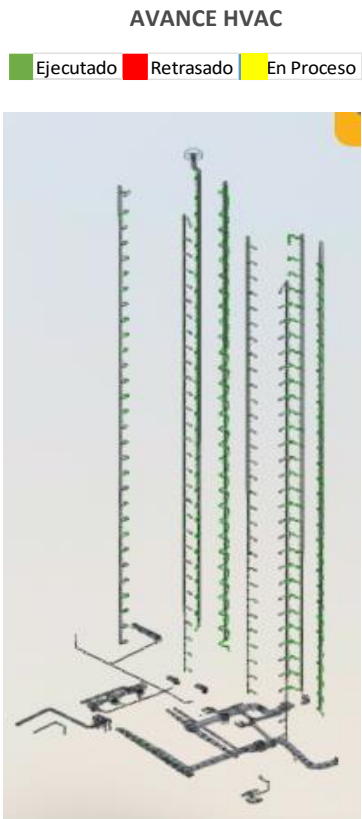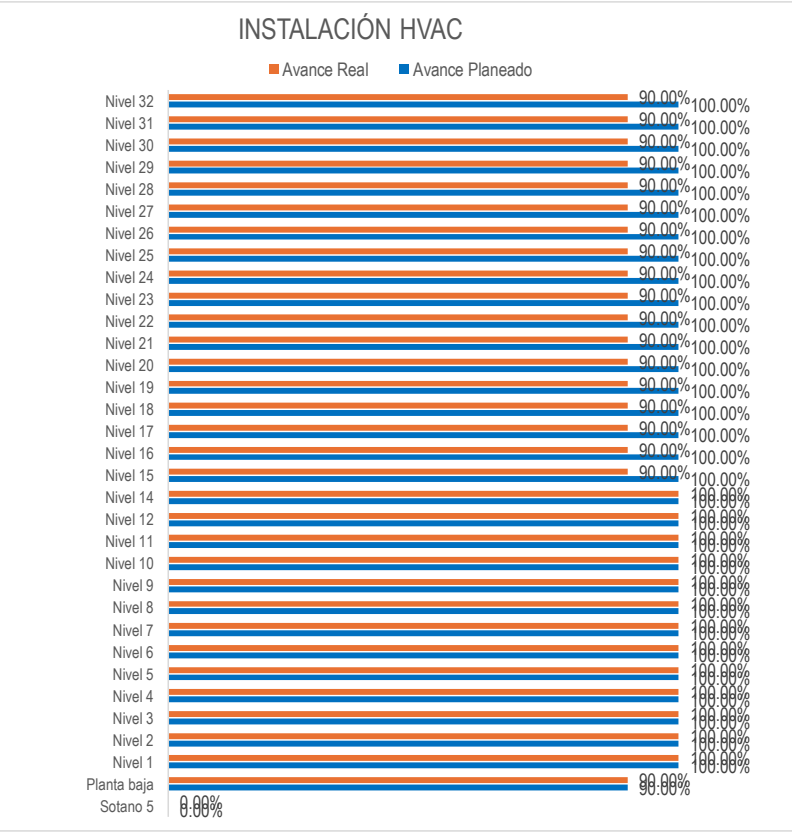

1. Falta liberación de tramo a partir del nivel 15 para la colocación de extractores en baños.


CANCELERIA

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Subcontratista	Importe	Tipo de Contrato	Anticipo (30%)	Retención 7.5%	Fecha Inicio	Fecha Término	Plazo Ejecución	Penalizaciones
VETROGALO	\$ 34,847,519.80	Precio Máximo	\$ 24,393,263.86	\$ 2,613,563.99	06/02/2023	03/05/2025	818 días	Si, máxima 10%

SITUACIÓN DEL CONTRATO

Obra Ejecutada	Obra Estimada	OENE	Ant. Amortizado	Retención 7.5%	Saldo Anticipo	Riesgo - Flujo	Deductivas	Aditivas
\$ 26,658,352.65	\$ 19,924,233.80	\$ 6,734,118.85	\$ 13,946,963.66	\$ 996,211.69	\$ 10,446,300.20	\$ 2,715,969.66	11255.42	\$ 1,154,814.37

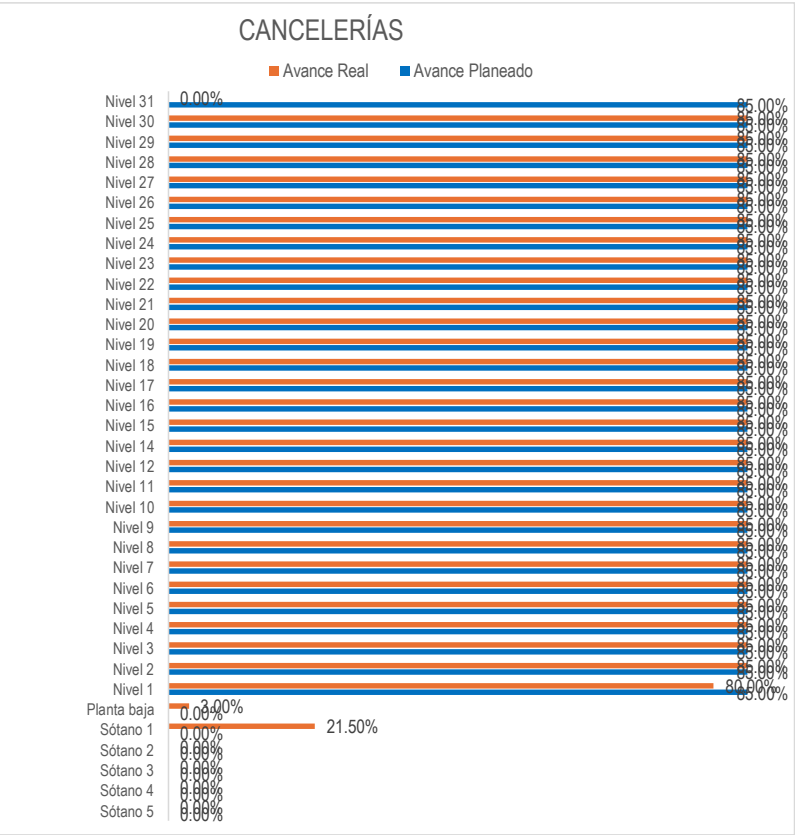

1. Se requiere la firma del convenio modificatorio por cambios de proyecto del nivel de amenidades
